

Programma Bereikbaar Valkenswaard




Voortgangsrapportage Raad

Bereikbaar valkenswaard

4^e kwartaal 2023

Op weg naar een Bereikbaar Valkenswaard!

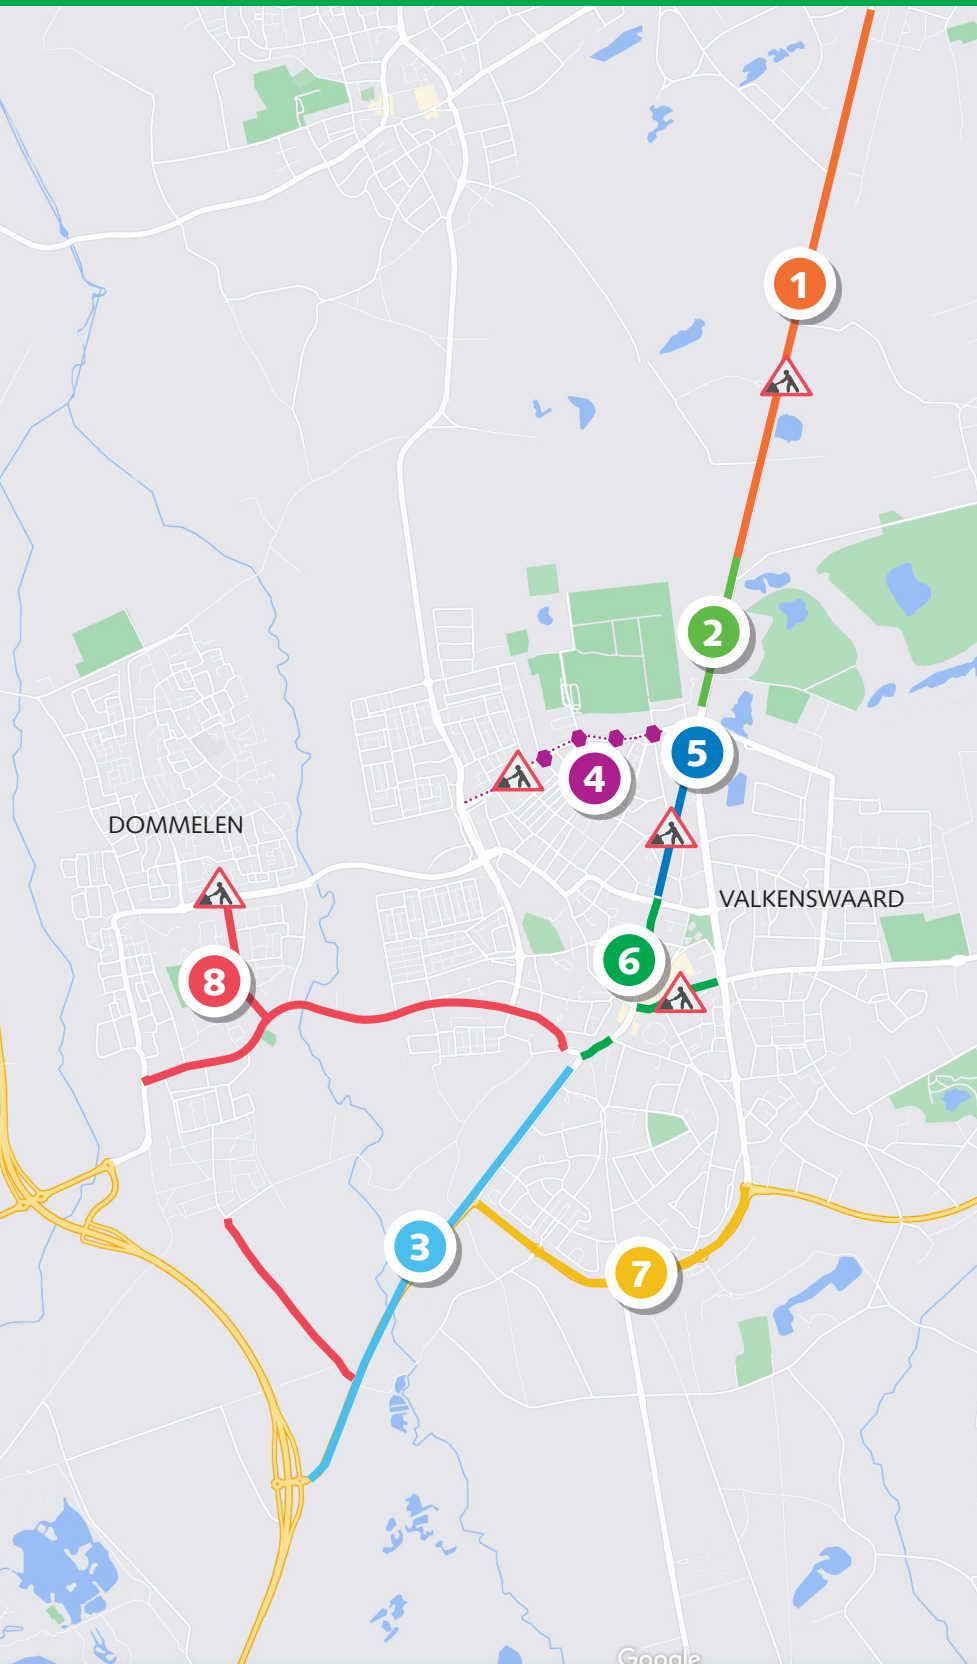

1

Valkenswaardseweg

De Valkenswaardseweg tussen Waalre en Valkenswaard wordt de komende twee jaar grondig aangepakt. Zo komen er onder meer maatregelen om vrachtverkeer te weren. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2024. Meer informatie: duurzaamdoorwaalre.nl

2

Eindhoveneweg-BUBEKO

Net zoals het Waalrese deel van de Eindhoveneweg/Valkenswaardseweg wordt ook het Valkenswaardse gedeelte ingericht als 60 km/u-weg. Naar verwachting is dit in juli 2023 gereed.

3

Valkenswaardse Poort

Door de komst van de Westparallel wordt het drukker aan de zuidkant van Valkenswaard. Met de maatregelen proberen we doorgaand verkeer zoveel mogelijk buiten de kern te leiden. Ook worden de fietsvoorzieningen verbeterd en wordt de Luikerweg conform de huidige verkeersveiligheidsvoorschriften ingericht. Planning:

1. Luikerweg tussen N69 en Zuidelijke Randweg: 1e en 2de kwartaal 2025
2. Luikerweg tussen Zuidelijke Randweg tussen Zuidelijke Randweg en Dommelseweg: 3e kwartaal 2025 en 1e kwartaal 2026.

4

Geenhovensedreef

Door de aanpassingen in het centrum pakken we in de tweede helft van 2023 verschillende kruispunten aan in het kader van de verkeersveiligheid.

5

Eindhoveneweg Noord

Omdat de Eindhoveneweg-Noord (vanaf Valkeniersstraat tot aan Europalaan) niet langer een verkeersfunctie heeft, kunnen we de weg inrichten als woonstraat. Zo komt er meer ruimte voor fietsers en groen. Tegelijkertijd pakken we de waterproblematiek aan. In eerste instantie komt er - nog voor de bouwvak van 2023 - een rotonde op de kruising met de Valkeniersstraat. De werkzaamheden aan het gedeelte vanaf de kruising Valkeniersstraat tot aan de Europalaan starten eind 2023 en duren tot medio 2024.

6

Centrum Valkenswaard

Het centrum van Valkenswaard ondergaat een metamorfose. Op diverse plekken wordt gewerkt aan de weg. Het centrum wordt bovenal gezelliger en groener. En het wordt een plek voor fietsers en voetgangers waar de auto vooral te gast is. De afgelopen jaren zijn de parkeerplaatsen aan de rand van het centrum al aangepakt. Ook de Markt, de Waalreseweg en een deel van de Eindhoveneweg zijn al klaar. De komende tijd wordt werken we nog aan onder meer de Leenderweg, Eindhoveneweg en Luikerweg. Meer informatie: valkenswaard.nl/masterplan

7

Zuidelijke Randweg

Om doorgaand verkeer zoveel mogelijk buiten de kern om te kunnen leiden, zijn er maatregelen nodig op de Zuidelijk Randweg. Hiermee willen we de doorstroming en de fietsvoorzieningen verbeteren en de verkeersveiligheid vergroten. Naar verwachting starten de werkzaamheden medio 2026

8

Dommelen-Zuid

De aanleg van de nieuwe N69, ook wel Westparallel genoemd, heeft gevolgen voor de verkeerssituaties op verschillende wegen in Dommelen-Zuid. We vinden het belangrijk dat de bereikbaarheid goed blijft en ook de leefbaarheid voor bewoners mag niet verminderen. Samen met de bewoners is gekeken welke aanpassingen nodig zijn. Uiteindelijk is er gekozen om de Bergstraat, de Norbertusdreef, de Vernbergseweg en de Dommelseweg aan te pakken. De Westerhovenseweg is al in 2021 opgeleverd. De planning van de uitvoering van de overige straten Dommelen Zuid en de Dommelseweg ziet er als volgt uit:

- Bergstraat: 1e en 2e kwartaal 2023
- Norbertusdreef: 3e en 4e kwartaal 2023
- Vernbergseweg: 3e kwartaal 2023
- Dommelseweg: 1e t/m 4e kwartaal 2024

Meer informatie: bereikbaarvalkenswaard.nl/werkzaamheden-dommelen-zuid



Kijk voor meer informatie op:
bereikbaarvalkenswaard.nl of
watgebeurtervoormijndeur.nl/valkenswaard

Naam	Fase	Status communicatie	Status Tijd	Status kwaliteit	Status gemeentelijk krediet	Status subsidies & bijdrage
BV 01&02 Uitwerking nieuwe verbinding en aansluiting Dommelen/Valkenswaard	Nazorg fase	●	●	●	●	●
BV 03 Overdracht N69/Eindhovenseweg-Luikerweg	Nazorg fase	●	●	●	●	▲
BV 06 Reconstructie Europalaan	Nazorg fase	●	●	●	▲	●
BV 07 Reconstructie Kruising Luikerweg - zuidelijke randweg	Ontwerpfase	●	●	●	▲	▲
BV 11 Reconstructie Kruising Luikerweg/Dommelseweg	Ontwerpfase	●	●	●	▲	▲
BV 12 Reconstructie kruising Dommelseweg/Nieuwe Waalresweg	Voorbereidingsfase	●	●	●	●	▲
BV 13 Planstudie N69-Zuid	Definitie	●	●	●	●	●
BV 14 Integrale aanpak Zuidelijke Randweg	Ontwerpfase	●	●	●	●	●
BV 16 Inrichting N69 tussen Europalaan en Valkeniersstraat	Voorbereidingsfase	●	●	●	●	●
BV 18 Inrichting bestaande N69 als 60 km/h zone	Voorbereidingsfase	●	●	●	●	●
BV 23 HOV & HUB infra Valkenswaard	Definitie	●	●	●	●	●
BV 24 Gebiedsimpuls Dommelpad	Ontwerpfase	●	●	▲	▲	●
BV 28 Verkeersmaatregelen Dommelen-zuid	Voorbereidingsfase	●	●	●	●	●
BV 28a Verkeersmaatregelen Westerhovenseweg (Dommelen Zuid)	Afgerond	●	●	●	●	●
BV 28b Verkeersmaatregelen Brouwerijdreef (Dommelen-Zuid)	Nazorg fase	●	●	●	●	●
BV 28c Verkeersmaatregelen Bergstraat en Norbertusdreef (Dommelen-Zuid)	Realisatiefase	●	●	●	●	●
BV 28d Verkeersmaatregelen Dommelseweg (Dommelen-Zuid)	Voorbereidingsfase	●	●	●	▲	●
BV 28e Verkeersmaatregelen Venbergseweg (Dommelen-Zuid)	Voorbereidingsfase	●	▲	●	●	●
BV 29 Reconstructie Luikerweg/Venbergseweg e.o	Ontwerpfase	●	●	●	●	●
BV 32 Bestemmingsplan ontsluiting Mgr Smetsstraat	Ontwerpfase	●	▲	●	▲	●
BV 37 Mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma 2020	Afgerond	●	●	●	●	●
BV 38 Herontwikkeling EMA terrein	Afgerond	●	▲	●	▲	●
BV 39 Herinrichting Luikerweg BIBEKO (tot Antwerpsebaan)	Ontwerpfase	●	●	●	▲	●
BV 41 Herinrichting Luikerweg BUBEKO	Ontwerpfase	●	●	●	▲	●
